


Nr.	Vorgangsr	Vorgangsname	Dauer	Vorgänger	Anfang	Fertig stellen	D. F Don 14. F Mon 18. Fre 22. Fe Die 26. Fe Sam 02. N													
							17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7			
0		Badsanierung	9,5 Tage		Mo 18.02.13	Fr 01.03.13														
1		Demontage	1,25 Tage		Mo 18.02.13	Di 19.02.13														
2		Folie ausgelegt und abgeklebt	2 Std.		Mo 18.02.13	Mo 18.02.13														
3		Wasserversorgung abgestellt und die Wasserleitungen entleert	1 Std.	2	Mo 18.02.13	Mo 18.02.13														
4		Wasser- und Abwasserleitungen verdichten	1 Std.	3	Mo 18.02.13	Mo 18.02.13														
5		Objekte demontieren	2 Std.	4	Mo 18.02.13	Mo 18.02.13														
6		Fliesen entfernen	4 Std.	5	Mo 18.02.13	Di 19.02.13														
7		Ende Demontage	0 Tage	6	Di 19.02.13	Di 19.02.13														
8		Neumontage	8,25 Tage		Di 19.02.13	Fr 01.03.13														
9		Neumontage von Wasser- und Abwasserleitungen	1,5 Tage	7	Di 19.02.13	Mi 20.02.13														
10		Stromleitungen und Steckdosen verlegt	1 Tag	7	Di 19.02.13	Mi 20.02.13														
11		Wandschlitze geschlossen und Unebenheiten beseitigt	1 Tag	9;10	Mi 20.02.13	Do 21.02.13														
12		Badewanne werden gestellt und angeschlossen	3 Std.	11	Do 21.02.13	Fr 22.02.13														
13		Badewanne ausgemauert	2 Std.	12	Fr 22.02.13	Fr 22.02.13														
14		Wände und der Boden gefließt bzw. verfugt	2 Tage	13	Fr 22.02.13	Di 26.02.13														
15		Spanndecke einbauen	1 Tag	14EA+1 fTag	Mi 27.02.13	Do 28.02.13														
16		Montage der Objekte und Installation der Armaturen	1 Tag	15	Do 28.02.13	Fr 01.03.13														
17		Montage der elektronischen Endgeräte	5 Std.	15	Do 28.02.13	Do 28.02.13														
18		Endabnahme	1 Std.	16;17	Fr 01.03.13	Fr 01.03.13														
19		Projektende	0 Tage	18	Fr 01.03.13	Fr 01.03.13														

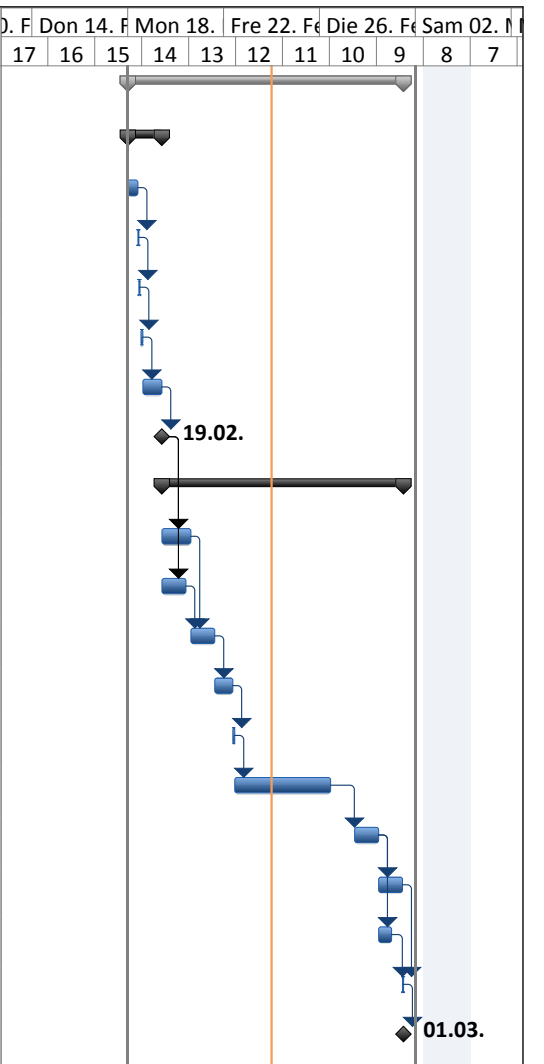

Projekt: Badsanierung Datum: So 24.02.13	Vorgang		Externer Meilenstein		Manueller Sammelrollup	
	Unterbrechung		Inaktiver Vorgang		Manueller Sammelvorgang	
	Meilenstein		Inaktiver Meilenstein		Nur Anfang	
	Sammelvorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Nur Ende	
	Projektsammelvorgang		Manueller Vorgang		Stichtag	
Externe Vorgänge		Nur Dauer		In Arbeit		
